

AI Job Navigator プロジェクトスケジュール・ご依頼事項

対象文書:

AI_Job_Navigator_Client_Requirements_Engineering_Specification_EN_Updated.docx **作成日:**

2026 年 8 月 31 日 **版数:** v5.0

0. 本書の目的

本書は以下の 4 点をまとめたものです。

1. 貴社よりご提供いただきたい事項と、それぞれが必要となる時期
2. 開発期間中および運用時の想定費用
3. **必須機能**の開発スケジュールのご提案
4. **任意機能**の一覧。必須機能の完成後に、別途ご計画いただくもの

必須機能と任意機能

本書で扱う機能は 2 つに区分しております。


必須機能は、要件仕様書の各 MVP フェーズに定義された機能です。これらが製品を構成するものであり、第 3 章のスケジュールに含まれるのはこの範囲のみです。

任意機能は、必須機能がすべて完成した後に追加を検討する機能です。第 4 章に見積とともに記載しておりますが、第 3 章のスケジュールからは意図的に除外しております。製品が動作するために必要な範囲のみをスケジュールに反映するためです。

開発体制

開発は開発者 1 名で実施いたします。第 3 章の期間はこれを前提に算出しております。

システム全体像

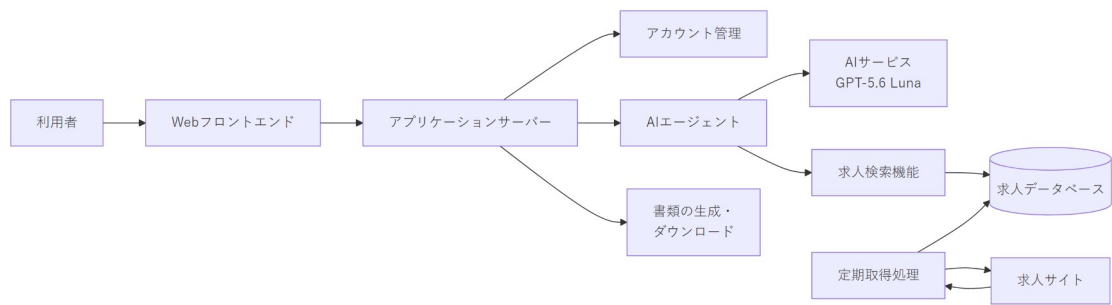

求人データの取得方針

スクレイピングによるデータ取得にあたっては、相手方サーバーに負荷をかけないよう配慮すべきとのご指示を承っております。この点は設計に反映しております。

取得は一定以上の間隔を空けた定期実行とし、利用者の操作を契機とすることはございません。したがって各取得元へのアクセス量は当方のスケジュールによって決まり、利用者数の増加によって変動いたしません。取得元が構造化されたデータの提供口を用意している場合は、ページの解析よりもそちらを優先いたします。相手方サーバーへの負荷が軽く、運用上も安定するためです。

現時点の実装状況

領域	状況
会話基盤－応答のストリーミング配信、同時アクセスの安全性、データ永続化、会話履歴の要約	完了。実運用水準です
AIエージェント基盤－機能呼び出しの制御、文脈の構築、AIサービスの抽象化	完了。現在は簡易な機能を1つ接続しているのみです
Web画面－チャット画面、会話一覧、テーマ切替	チャットのみ完了。他の画面は存在しません
アカウント管理－登録・ログイン・パスワード再設定	未着手
求人データ－収集・保存・検索・重複排除	未着手
書類作成－雛形・生成・ファイル出力・アップロード	未着手
決済・有人対応・管理画面	未着手

全体の 15～20%程度が完了しております。現在完成しているのは、AIとの会話を安定して成立させる基盤部分です。製品をキャリアサービスたらしめる機能は未着手であり、第 3 章のスケジュールはその全体を対象としております。

1. 貴社よりご提供いただきたい事項

1.1 AI サービス – 直ちに必要となる唯一の項目

本書のご依頼のうち、後続フェーズではなく現時点で必要となるのは本項のみです。

本システムには商用の AI サービスが必要となります。**GPT-5.6 Luna** をご提案いたします。料金は入力 100 万トークンあたり 0.20 米ドル、出力 100 万トークンあたり 1.20 米ドルです。

現在の開発環境では不十分である理由。 現在は 2 つの暫定的な手段で開発を進めておりますが、いずれも本プロジェクトを継続できるものではございません。

現在の手段	問題点
ローカル環境で動作するモデル	動作が遅く反復的な開発に適さず、また応答品質が機能の成否を判断できる水準に達していません
無償枠で提供されるモデル	利用制限により断続的に応答が停止いたします。自動テストの完了を前提にできません

本サービスに依存する範囲:

フェーズ	AI サービスを必要とする機能	未導入の場合
フェーズ 0	応答品質の評価環境	品質の基準値を設定できません
フェーズ 1	一気通貫の技術検証	アーキテクチャの成立を確認できません
フェーズ 2	AI による聞き取り、書類内容の文章生成	当該フェーズの中心的機能です。開発・確認ともに実施できません
フェーズ 3	自然文からの条件抽出	開発・確認ともに実施できません
フェーズ 4	日本語の応答品質の改善	当該フェーズの目的そのものです

フェーズ	AI サービスを必要とする機能	未導入の場合
フェーズ5	有人対応への引き継ぎ判断	動作確認を実施できません

フェーズ1以降、すべてのフェーズが本サービスに依存いたします。


処理1回あたりの費用

現行のシステム構成にて実測した値をもとに算出しております。

処理	費用
会話の初回メッセージ	\$0.0010
通常の会話1往復	\$0.0016
求人検索をとまなう会話1往復	\$0.0033
会話履歴の要約処理1回	\$0.0009
30往復の相談1件あたり	約 \$0.08

求人検索の費用が通常の約2倍となるのは、AIサービスとのやり取りが2往復必要となるためです。

図1 — 利用者が求人を尋ねた場合の処理の流れ

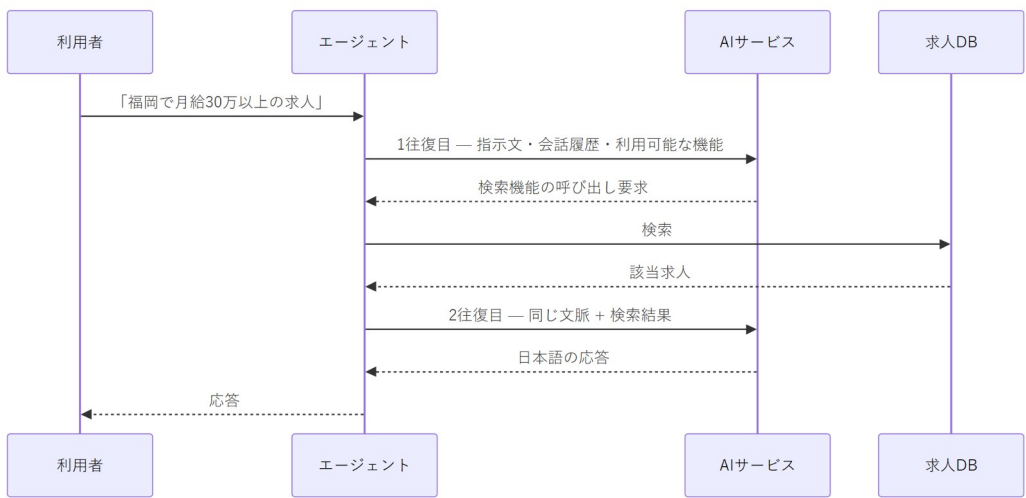

開発期間中の月額費用

費用は一定ではございません。AIの挙動を構築・調整するフェーズに集中いたします。

フェーズ	期間	AI サービス月額
フェーズ0 — 準備・調査	1週間	\$8

フェーズ	期間	AI サービス月額
フェーズ1 — 基盤構築	4 週間	\$15
フェーズ2 — 書類作成	4 週間	\$50
フェーズ3 — 求人検索	5 週間	\$45
フェーズ4 — 品質改善	3 週間	\$40
フェーズ5 — 商用機能	5 週間	\$10
フェーズ6 — 品質強化・リリース	3 週間	\$20
プロジェクト全体の合計	25 週間	約 180 米ドル

上限額を月 50 米ドルとし、これに達するのはフェーズ 2～4 のみとなる想定です。

参考までに、月 100 米ドルに到達するには最大長の AI リクエストを 1 日約 4,400 回実行する必要があります。開発者 1 名の手動確認でこの量に達することはなく、上記の上限額は想定費用ではなく安全装置としての位置づけです。

主たるリスクは利用量ではなく不具合です。 AI が同一の処理を繰り返し呼び出す不具合が発生した場合、放置すると 1 時間あたり 5 米ドル程度を消費いたします。フェーズ 0 において 2 つの対策を実装いたします。サービス側での上限額設定と、AI 処理内部での繰り返し回数の上限設定です。

1.2 後続フェーズで必要となる事項

以下はいずれも現時点では不要です。急なご依頼とならないよう、必要となるフェーズを明記しております。

必要となる時期	項目	用途
フェーズ2	実際の履歴書・職務経歴書（個人情報伏せたもの）5～10 通	3 つの目的がございます。 下記をご参照ください
フェーズ2	ベースとする履歴書・職務経歴書の様式	書類雛形の開発

必要となる時期	項目	用途
フェーズ 2 以降	日本語レビュー担当者 のご指名	AI が生成する日本語の 継続的な確認。第 1.3 節をご参照ください
フェーズ 5	決済システムの接続情報 および仕様	第 1.4 節をご参照ください
フェーズ 6	本番ドメインおよび DNS の管理権限	TLS 証明書の取得、本 番環境の構築

実物の書類をお願いする理由について。 以下の 3 つの目的がございます。いずれも架空の例では代替できません。

1. **雛形を作成するため。** ご使用の様式について、どの項目がどの順序で、どのような見出しと余白で配置されているかを実物で確認する必要があります。記入用の雛形を想像で作成することはできません。
2. **AI に「良い出力」の見本を示すため。** 承認済みの実例を AI に提示することが、生成される日本語を自然なものにするうえで最も効果の高い方法です。第 1.3 節に記載の文体の課題に対する直接的な対策となります。
3. **品質を測定するため。** AI の出力が許容水準にあるかを判断するには、比較対象が必要です。実例がなければ、十分な品質かという問いに答える基準がございません。

また実物の書類には、離職期間、転職、非常勤期間といった、架空の例には現れない多様性がございます。本システムが正しく扱うべきなのは、まさにそうした実際の記載です。

個人情報是不要ですので、削除のうえご提供ください。必要なのは構成と文章表現です。

1.3 AI 応答品質のレビュー体制 – フェーズ 2 より開始

一度限りの成果物ではなく継続的なご協力のご依頼となりますため、必要となるのはフェーズ 2 からではございますが、早めにご相談させていただきます。

AI モデルが生成する日本語は、文法的には正確です。懸念されるのは正確性ではなく**文体・語調**、すなわち生成された職務経歴書が、日本企業の採用担当者や経営層の目から見て適切なものと映るかという点にございます。この点は自動的な指標では測定できません。

つきましては、フェーズ 2 以降、貴社にて日本語のレビュー担当者をご指名いただき、各回のデモンストレーションにおいて AI の出力サンプルをご確認のうえ、どの応答が望ましいかをご指示いただきたく存じます。所要時間は 1 回あたり 2 時間程度を想定しております。

ご指摘の反映方法。 レビュー結果は段階的に反映いたします。まず AI への指示文の調整、次に承認済みの実例を AI に提示する方法、さらに必要であれば案件ごとに関連する実例を自動的に選

び出して提示する仕組みの構築です。これらの手段を尽くしてなお品質が許容水準に達しない場合に限り、より上位の AI モデルへの変更をご提案いたします。設定変更のみで対応でき、アプリケーションの改修は不要ですが、運用費用は概ね 10～15 倍、相談 1 件あたり約 0.08 米ドルから約 0.80～1.20 米ドル程度となります。ユーザー数 10 名の段階では大きな金額ではございませんが、ユーザー数を大きく増やす前に改めて検討をご提案いたします。

1.4 決済システム – フェーズ 5 で必要

ご提示いただいた参考 URL より、決済システムは GMO ペイメントゲートウェイの環境であり、海外の汎用決済サービスではないものと理解しております。

本作業の見積および実装のため、フェーズ 5 までに以下をご確認いただきたく存じます。

項目	補足
接続方式のご指定	リンクタイプ・モジュールタイプ・プロトコルタイプがございます。方式により作業量が大きく異なります
テスト環境の接続情報(ショップ ID・ショップパスワード)	貴社の GMO 契約に基づき発行されるものです。これがない状態では決済処理のコードを記述・検証することができません
対応する決済手段の範囲	クレジットカードのみか、コンビニ決済・銀行振込・キャリア決済等を含むか。手段ごとに個別の実装が必要であり、カード以外は即時完了ではなく非同期の処理となります
3D セキュアの要否	決済の流れに銀行での本人確認の手順が追加されます
料金プラン・無料範囲・解約規定	仕様書上、未確定と記載されております

接続方式が確定するまで、フェーズ 5 の見積は暫定となります。 リンクタイプであれば 2 週間程度、プロトコルタイプであれば 4 週間程度を要します。第 3 章のスケジュールはその中間の数字を採用しております。

2. 費用

金額はいずれも米ドル建てで、AWS の東京リージョンを前提としております。概算であり、確定にあたっては AWS 料金計算ツールでの確認を推奨いたします。

2.1 開発の進め方ーローカル環境を基本とする

開発はローカル環境で実施し、クラウド環境は機能上必要となった時点で構築いたします。初週から本格的なクラウド環境を用意することは、必要となる数か月前から費用を負担することを意味いたします。

クラウド環境が必要となる時点は以下のとおりです。

要件	フェーズ	理由
無人での定期取得	フェーズ1	開発機は常時稼働では ございません。求人データ は中断なく蓄積される必 要がございます
決済ゲートウェイからの通 知受信	フェーズ5	決済事業者からアプリケ ーションサーバーへ直接到 達できる必要があり、ロー カル環境では受信できま せん
TLS・本番ドメイン・セッシ ョンの安全性	フェーズ6	一般公開の前提となりま す
同時接続10名での負荷 試験	フェーズ6	ローカル環境では確度を もって測定できません

なお、フェーズ1の中で一度デプロイを実施し、アプリケーションが正しく配置できることを確認いたします。デプロイに関する問題を、プロジェクト終盤ではなく開始時点で把握するためです。

2.2 開発期間中の費用

フェーズ	期間	環境	AWS	AI サービス	月額換算
フェーズ0 ー 準備・ 調査	1 週間	ローカルの み	\$0	\$8	\$8
フェーズ1 ー 基盤構 築	4 週間	ローカル + 収集用イン スタンス	\$8	\$15	\$23
フェーズ2 ー 書類作 成	4 週間	ローカル + 収集用イン スタンス	\$8	\$50	\$58
フェーズ3 ー 求人検 索	5 週間	ローカル + 収集用イン スタンス	\$10	\$45	\$55

フェーズ	期間	環境	AWS	AI サービス	月額換算
フェーズ 4 — 品質改善	3 週間	ローカル + 収集用イン スタンス	\$10	\$40	\$50
フェーズ 5 — 商用機能	5 週間	検証環境 を構築	\$40	\$10	\$50
フェーズ 6 — 品質強化・リリース	3 週間	本番環境 + 検証環境	\$85	\$20	\$105

プロジェクト全体を通じた開発費用は約 330 米ドルとなります。 内訳は AWS が約 150 米ドル、AI サービスが約 180 米ドルです。

開発用サーバーは業務時間中のみ稼働させ、夜間および週末は停止する前提としております。常時稼働と比較して約 70%の削減となります。仮に常時稼働とした場合、AWS 分はプロジェクト全体で約 450 米ドル程度まで増加いたしますが、AI サービス分はほとんど変動いたしません。AI の費用は経過時間ではなく、実施する確認作業の量によって決まるためです。


2.3 リリース時の本番環境

ご指定のとおり、同時接続ユーザー数 10 名を前提としております。

項目	構成	月額
アプリケーションサーバー	EC2 t4g.small (2 vCPU / 2 GB)	\$18
データベース	RDS PostgreSQL db.t4g.small、50 GB、シングル AZ	\$45
求人データ取得処理	Fargate 定期実行、月 24 時間程度	\$3
書類保管	S3	\$1
フロントエンド配信	CloudFront + S3	\$1
DNS	Route 53	\$0.50
ログ	CloudWatch	\$3
データ転送		\$2
インフラ小計		\$74
AI サービス	同時接続 10 名	\$5

項目	構成	月額
合計		月額 約 79 米ドル

本番環境の月額費用の内訳 (USD)

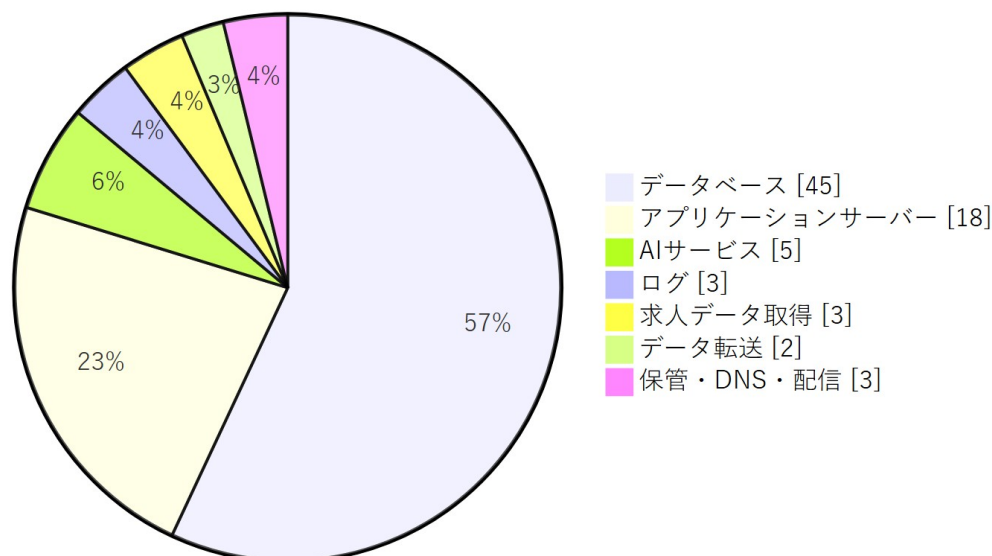

冗長化のためロードバランサーを追加する場合、月額約 20 米ドルの増加となります。同時接続 10 名の段階では推奨いたしません、利用が増加した際に最初に検討すべき拡張です。

2.4 割引プランについて

AWS には、1 年間の利用量を確約することで 30～40%程度の割引を受けられる制度がございます。

現段階での契約は推奨いたしません。 同時接続ユーザー 10 名の想定ではインフラ費用は月額約 74 米ドルであり、割引額は 25 米ドル程度にとどまります。これを得るためには、実際の利用状況を把握する前に、かつユーザー数の変動が見込まれる時期に、サーバー構成を 1 年間固定することになります。

リリース後 3～6 か月間は通常料金で運用し、実際の利用状況を測定したうえで、確認できた水準に対して 1 年契約を購入する進め方をご提案いたします。

2.5 費用に関する留意点

NAT Gateway について。 AWS のネットワーク構成要素の一つで、利用量にかかわらず月額 32 米ドル程度が発生いたします。一般的な構成例には既定で含まれていることが多い一方、本件の規模では不要です。本書の構成では使用しない設計としております。仮に含めた場合、第 2.3 節の中で最大の費目となります。

データベース容量の増加について。 ユーザー数 10 名ではサーバー性能は問題となりません。処理の大部分を AI サービスが担うためです。増加するのは保存容量で、求人データ 10 万件と検索用インデックスで、インデックスのみで約 600 MB を要します。1 年以内に 50～100 GB を見込んでおくことを推奨いたします。なお現在のご方針どおりアップロード書類・生成書類を無期限に保持する場合、保存容量は経年で増加いたしますので、年 1 回程度の見直しをお勧めいたします。

3. 開発スケジュール – 必須機能

3.1 開発方式

開発は 7 つのフェーズに分けて進行いたします。**各フェーズの完了時に、動作するものをご確認いただくデモンストレーションと、書面による進捗報告を実施いたします。**

フェーズの期間は固定せず、作業内容に応じて設定しております。フェーズごとに規模が大きく異なるためです。自動テストの作成は最終段階にまとめるのではなく、各フェーズ内で実施いたします。

3.2 初期リリースの範囲

以下の項目は、リリース時点では定めた形で提供し、残りをその後に対応いたします。スケジュールの前提となる範囲を明確にするため、また、ご希望があればいずれの項目も前倒しできるよう、明記しております。

項目	リリース時点	その後の対応
求人取得元	2 社	残り 2 社を追加
重複排除	企業名・職種名・勤務地の完全一致	実データの蓄積後、取得元をまたぐ照合へ
書類様式	履歴書・職務経歴書 各 1 様式、PDF 出力	様式の追加および Word 出力
管理画面	運用に必要な機能	運用上の必要に応じて残りの機能を追加

適用している考え方は、深さではなく広さを絞るというものです。取得元や様式の追加は、動作しているシステムに対して比較的容易に行えます。一方で重複排除は、後回しにするほど対応が困難になる唯一の項目であり、それゆえ削除ではなく縮小にとどめ、データ収集を最初の実作業フェーズから開始いたします。

3.3 本計画における 2 つの方針

求人データの収集はフェーズ 1 で開始し、以降継続いたします。 重複排除は相当量の実データを前提とし、そのデータは作業量ではなく日数の経過によって蓄積されます。フェーズ 3 で重

複排除を構築し、フェーズ4で精度を高める時点では、約2～3か月分の収集データが利用可能となる見込みです。また項目の抽出前に元ページを保存いたします。抽出処理を改善した際に、取得元へ再度アクセスすることなく、保有済みのデータに対して再実行できるようにするためです。

フェーズⅠの完了時に、一気通貫の技術検証を実施いたします。 個別機能の作り込みに入る前に、システムを端から端まで通す経路が動作することを確認いたします。すなわち、利用者がログインし、質問を行い、AIが検索機能呼び出し、実際の求人データが返るという一連の流れです。これは意図的に最小限のものであり、完成品ではございません。目的は、アーキテクチャが成立することを確認し、連携上の問題を、対処が最も高くつくプロジェクト終盤ではなく開始時点で把握することにあります。

3.4 求人データ処理の流れ

図2ー 求人データの取得から提示までの流れ



3.5 スケジュール

フェーズ	内容	期間
フェーズⅠ	準備・調査 ローカル開発環境の整備 AI サービス設定、上限額設定、繰り返し回数の上 限設定 日本語品質の評価環境 求人取得元の調査	1 週間
フェーズⅡ	基盤構築 アカウント機能: 登録・ロ グイン・セッション・パスワー ド再設定・メール認証 既存画面のセキュリティ強 化 求人データ構造およびデ ータベース設計 取得間隔の制御を含む 収集基盤 1 社目からの継続的な収 集	4 週間

フェーズ	内容	期間
	一気通貫の技術検証	
フェーズ 2	デプロイ確認 書類作成	4 週間
フェーズ 3	履歴書・職務経歴書の 雛形および生成処理 PDF 出力とダウンロード AI 聞き取りの改善 2 社目の取得元を収集 対象に追加 求人検索	5 週間
フェーズ 4	給与単位・地名・休日表 記の正規化 重複排除 自然文からの条件抽出 検索機能と AI の連携 書類のアップロードおよび 記載内容の抽出 品質改善	3 週間
フェーズ 5	レビュー結果に基づく日本 語応答品質の改善 掲載状況の確認、取得 日時の表示 利用者による確認画面、 検索結果の表示 重複排除の精度調整 商用機能	5 週間
フェーズ 6	決済連携、料金プラン、 解約処理 アプリ内有人対応および 引き継ぎ 管理画面 品質強化・リリース	3 週間

フェーズ	内容	期間
	性能・セキュリティ・同時 接続 10 名での負荷試験 本番環境構築、検収の ご支援	
合計		25 週間

約 6 か月となります。

フェーズ0・1週間
準備・調査



フェーズ1・4週間
基盤構築
アカウント、データ収集開
始、
一気通貫の技術検証



フェーズ2・4週間
書類作成




フェーズ3・5週間
求人検索・重複排除



以降、収集を継続



図 3-1 フェーズの流れ。各フェーズの完了時にデモンストレーションを実施いたします。



3.6 当初の3か月という見積について

当初の3か月という数字は、要件仕様書が存在する前に作成したもので、対象範囲がより狭いものでした。現在の仕様書に記載された内容は、その約2倍の作業量に相当いたします。

増加分は、当初の想定に含まれていなかった作業によるものです。具体的には、アカウント管理、決済処理、管理画面、有人対応、セキュリティ強化、検収対応、および複数サイトにまたがって掲載される求人の重複排除です。

3.7 スケジュールの確定について

実データを確認するまで十分な確度をもって見積れない項目が2点ございます。取得元からの収集の安定性と、重複排除で達成可能な精度です。加えて決済連携が、第1.4節の接続方式に依存いたします。

つきましては、上記スケジュールは暫定のものとしてお取り扱いいただき、**確定日程はフェーズ①の完了時に取り決めさせていただきたく存じます。** フェーズ0には求人取得元の調査が含まれており、その完了時点、すなわち着手から1週間後には、確定したスケジュールをご提示できる見込みです。

フェーズの所要期間が見積を超過する場合は、プロジェクト終盤ではなく各フェーズの区切りごとにご報告いたします。また第3.2節の範囲に関する項目は、いずれの方向にも調整可能な余地として引き続きご利用いただけます。

より短い期間をご希望の場合、最も効果の大きい変更はフェーズ5(決済・有人対応・管理画面)を後回しとすることで、完成度のある製品を5週間前倒しできます。

4. 任意機能

以下は**第3章のスケジュールには含まれておらず**、製品の動作に必要な機能でもございません。必須機能がすべて完成した後、別途の作業として計画的にご検討いただけるよう、見積とともに記載しております。

機能	期間	前提
通知機能 — 検索条件の保存、新着求人との日次照合、メール送信基盤、通知設定	3 週間	フェーズ 3
求人取得元の残り 2 社	2 週間	フェーズ 1 の収集基盤
重複排除の精度向上 — 完全一致から取得元をまたぐ照合へ	3 週間	相当量の実データ
Career Advancement Assessment — 完成した職務経歴書の評価および管理者による確認	3 週間	フェーズ 2 および管理画面
LINE 連携 — 公式アカウント、Messaging API、LINE アカウントとサービスアカウントの紐付け	2.5 週間	通知機能
OCR — スキャンされた画像・写真からの読み取り	2 週間	フェーズ 3
管理画面の全機能 — 残りの機能	2 週間	フェーズ 5
書類様式の追加および Word 出力	1 週間	フェーズ 2
書類のメール送付	3 日	通知機能
SNS からの求人取得	3 週間	事前調査が必要。実現不可の可能性もございます
すべて実施した場合の合計	約 22 週間	

上記は当方が推奨する構築順に並べております。いずれも現時点でのご決定は不要です。

4.1 個別の補足

通知機能は、最初にご要望をいただく可能性が最も高い機能です。 仕様書において検索条件の保存が存在する理由がこの機能にあります。本機能がない状態では、利用者は新着のご案内を受け取るのではなく、ご自身で再度検索を実行することになります。製品としては動作いたしますが、利便性は下がります。

メール送信はそれ以外の用途では必要となりません。 通知機能を必須範囲から外したため、生成書類はブラウザからのダウンロードでお渡しいたします。なお、パスワード再設定とメールアドレス確認のための最小限のメール送信機能は、フェーズ1で構築いたします。これらがなくアカウント機能は実用に耐えないためです。これはアカウント機能を支える基盤であり、通知機能とは別のものです。

SNSからの取得については、費用の問題ではなく実現自体が困難な可能性がございます。 一部のプラットフォームでは、第三者が公開投稿を横断的に検索する手段が提供されておりません。上記の見積は取得手段が存在することを前提としており、着手のご判断の前に調査を行うべきと考えます。

Career Advancement Assessment は、優先順位にかかわらず先行して構築することができません。 完成した職務経歴書を対象とし、管理者による確認フローを前提とするため、書類作成機能と管理画面の双方に依存いたします。

5. 前提条件

以下のいずれかが異なる場合、該当する数値は変動いたします。

- 開発者は1名(プロジェクト全期間を通じて)
- リリース時の同時接続ユーザー数は10名
- リリース時の求人取得元は2社とし、残り2社は後日追加
- リリース時の重複排除は完全一致による判定とし、実データの蓄積後に精度を向上
- リリース時の書類様式は1種類・PDF出力のみとし、様式の追加とWord出力は後日
- リリース時の管理画面は運用に必要な機能に限定
- 第4章に記載の機能はすべて第3章のスケジュールから除外
- 有人対応はアプリ内チャットのみ
- 生成書類はダウンロードでお渡しし、メールはアカウント機能のみに使用
- アップロード書類・生成書類は現在のご方針どおり無期限に保持
- 開発はローカル環境を基本とし、クラウド環境は第2.1節に従って構築
- フェーズの期間は作業内容に応じて設定
- 画面設計・UIは当方にて決定し、貴社にご確認いただく

- 利用規約およびプライバシーポリシーは貴社にて作成
-

6. 次のステップ

本書のご確認



AIサービス費用のご承認
第1.1節



フェーズ0の開始
1週間



調査結果のご報告

着手にあたり必要となるのは第 1.1 節の AI サービスのご承認のみです。第 1 章のその他の項目はいずれも後続フェーズで必要となるものであり、事前にご準備いただけるよう記載しております。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
